

AVANCES

Proyectos bajo Esquema Mixto

Datos generales, avance en gestiones de permisos y plazos de construcción estimados

26 de octubre de 2026



2026 año de Margarita Maza

Diseño del portafolio de Proyectos de Colaboración Mixta

Gobierno de México | CFE

Total de 36 Proyectos — **7,102.18 MW**

12 Proyectos con posible inicio de construcción en 2026	1,145 MW
24 Proyectos con posible inicio de construcción en 2027	5,957.18 MW

Nota: *Del total de 38 proyectos se excluyen "Delaro" & "Sierra Madre [El Chorro]" ya que se pasan a segunda ronda.*



Resumen de proyectos prioritarios

Corte al 26 de octubre de 2026



2026 año de Margarita Maza

PROYECTOS PRIORITARIOS MIXTOS

Gobierno de México | CFE

Corte al:
26 de octubre de 2026

No	Socio	Proyecto	Tec.	Cap.	Fecha comprometida de aceleración	Derechos Inmobiliarios C / LT	MIA C / LT	ETJ C / LT	MISSE O EVIS C / LT	Consulta Indígena C / LT	INAH C / LT	PEMEX C / LT	CONAGUA C / LT	AFAC C / LT
1	ACTIS	PV SANDOM SOLAR	FV	54.00	17-dic-26									
2	ACTIS	VIENTO DE BELLA UNIÓN	FV	120.00	17-dic-26									
3	ATLÁNTICA	DALIA 3 PV (CASTAMAY)	FV	100.00	10-dic-26									
4	CÚBICO	PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES DE TAMAULIPAS	FV	78.00	17-dic-26									
5	ELAWAN WIND	SAN PEDRO SOLAR	FV	98.20	11-dic-26									
6	FISTERRA	PLANTA SOLAR HAAB KIIN	FV	123.20	04-dic-26									
7	FISTERRA	SAN SIMÓN SOLAR	FV	80.00	04-dic-26									
8	GRUPO ZML	ÁLVARO OBREGÓN	FV	90.00	03-dic-26									
9	POLARIS	DON HUMBERTO	FV	19.20	18-dic-26									
10	SELKA	SELKA POWER PLANT I	FV	141.40	11-dic-26									
11	THERMION	ENERGEO LOS MOLINOS	EO	171.00	17-dic-26									
12	THERMION	SOL DE SONORA – 70	FV	70.00	17-dic-26									

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**



AVANCES

Proyectos bajo Esquema Mixto (prioritarios)

Datos generales, avance en gestiones de permisos y plazos de construcción estimados

Corte al 26 de octubre de 2026



2026 año de Margarita Maza

PV SANDOM SOLAR (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
Hopelchén, Campeche	54.0 MW 34.08% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
ACTIS	01-abr-27/ 31-oct-28

Firma del contrato
08-jul-2026

125 Plazas




Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 135.87 ha, 3 años +2+30+5+5	-	14-ago-26	Obtenidos.	✓
			LT: 6.0 km	En Proceso	-	**LT**: pendiente por acordar contratos, se formalizará una vez realizando la consulta indígena.	✎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En elaboración	23-oct-26	-	Se ingresó el 23 de octubre 2026.	✎
			LT: En elaboración	23-oct-26	-	Se ingresó el 23 de octubre 2026.	✎
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: No aplica	-	-	No aplica.	✗
			LT: En elaboración	En Proceso	-	Aplica cambio de uso de suelo en el 95% del trazo y su ingreso está condicionado a consulta indígena y requiere adquisición de los predios.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En evaluación	22-sep-26	16-oct-26	Se atendió requerimiento el 22 de septiembre 2026. Se emitirá resolutivo el 16 de octubre.	◉
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	16-oct-26	-	El socio informa que el 16 de octubre se inició el proceso.	◉
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: Actualización	En proceso	-	**Liberado**, se debe actualizar reingresando el formato INAH-05-001 para revalidación.	↻
			LT: En elaboración	30-oct-26	-	Se realizará vuelo LiDAR y se ingresará el trámite el 30 de octubre.	✎
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	01-oct-26	Liberado el 1 de octubre 2026.	✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	22-oct-26	Liberado el 22 de octubre 2026.	✓
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	15-oct-26	-	**Liberado para central y LT en 2025.** Se ingresó actualización el 15 de octubre 2026.	◉

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Línea del tiempo



Ruta crítica

Consulta Indígena, concluir los derechos inmobiliarios de LT, ETJ de la LT y adquirir derechos inmobiliarios para la ampliación de la SE Hopelchén

VIENTO DE BELLA UNIÓN (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Arteaga, Coahuila	120.0 MW 34.08% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
ACTIS	30-abr-27/ 31-oct-28

Firma del contrato
03-jul-2026

125 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 306 ha, 35 años +5	-	30-oct-26	**Central**: 50% faltante se encuentra en proceso de formalización mediante contratos de arrendamiento.
			LT: 3.0 km	-	30-oct-26	**LT**: La LT está dentro de los predios de la central, los cuales están formalizados y registrados al 95%.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En evaluación	13-oct-26	-	Se ingresó el 13 de octubre 2026.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	23-sep-26	No aplica. El socio confirma que el incremento a la superficie del proyecto no impacta zonas con vocación forestal, por lo que no se requerirá gestionar el CUSTF.
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	23-oct-26	-	El 19 de octubre se presentó el Plan de Gestión Social y el 23 de octubre 2026 se ingresó el trámite.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	25-sep-26	-	Liberado para la central en 2018, sin embargo, se ingresó la actualización el 25 de septiembre.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	23-oct-26	-	Se ingresó el 23 de octubre 2026.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	La autoridad les hizo unas observaciones para mover el polígono por temas de inundación, el socio menciona que no afecta al predio, es el arreglo fotovoltaico y el predio es el mismo.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	23-oct-26	-	Se ingresó el 23 de octubre 2026.

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Concluir derechos inmobiliarios de la central (es responsabilidad del socio).

Línea del tiempo



DALIA 3 PV (CASTAMAY) (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Campeche, Campeche	100.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Atlántica Renewable Power México	01-mar-27/ 31-dic-28

Firma del contrato
03-jul-2026

400 Plazas



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica


Ruta crítica

ETJ de la central, Consulta Indígena, Definición de LT (~18.92 km), todos los trámites relativos a la LT y tema con SICT

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 272 ha, 30 + 10	-	09-oct-26	**Central**: Obtenidos. Solamente se precisan correcciones sobre la superficie registrada en el Registro Público de la Propiedad.
			LT: 18.9 km	En proceso	-	**LT**: El socio informa que CPTT-CFE (está en proceso de formalización el contrato) apoyará con estos trámites.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En evaluación	25-ago-26	-	El 13 de octubre les solicitaron un requerimiento de información, **se prevé ingresar el 27 de octubre 2026.**
			LT: En evaluación	20-oct-26	-	Se ingresó el 20 de octubre 2026.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Se ingresará el trámite de no aplicabilidad.
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: En evaluación	12-oct-26	-	El 01 de septiembre la autoridad realizó una prevención y el 12 de octubre se realizó el desahogo. **Se prevé que se emita el 26 de octubre.**
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	26-oct-26	-	El 26 de octubre se iniciará con la integración del comité técnico.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: Liberado	-	jun-2024	**Liberado** en junio de 2024.
			LT: En evaluación	20-oct-26	-	El 20 de octubre se inició la prospección de algunas zonas de interés las cuales tardarán entre 8-10 días.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central:** Liberado	-	ago-2024	**Liberado** en agosto de 2024.
			LT: En elaboración	15-nov-26	-	Se ingresará el trámite el 15 de noviembre (depende del trazo del 20% pendiente).
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: Liberado	-	jun-2023	**Liberado** en junio de 2023.
			LT: En elaboración	16-oct-26	-	Se ingresará el trámite el 15 de noviembre (depende del trazo del 20% pendiente).
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	may-2026	**Liberado** en mayo de 2026.
Cruces	SICT	VoBo	**LT**: En elaboración	23-sep-26		el 23 de septiembre el socio ingresó el trámite ante la SICT local; como resultado de la revisión, la autoridad autorizó aproximadamente el 80 % del trazo propuesto, mientras que para el 20 % restante solicitó la presentación de una nueva propuesta de trazo para su evaluación y autorización.

Línea del tiempo



PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES DE TAMAULIPAS (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
Altamira, Tamaulipas	78.0 MW 32.94% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Cúbico	01-ene-27/ 01-jul-28

Firma del contrato
03-jul-2026

350 Plazas



Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 251 ha, 30 + 10	-	10-ago-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 4.3 km	-	En proceso	**LT**: Se tiene un avance del 90%.	✎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: Liberado	22-sep-26	8-oct-26	**Liberado, se tiene resolutivo del 8 de octubre 2026.**	✓
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En evaluación	30-oct-26	-	Se realizara el pago al fondo forestal el 30 de octubre 2026.	◉
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: Liberado	28-ago-26	17-sep-26	**Liberado, se tiene resolutivo del 17 de septiembre 2026.**	✓
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica	✗
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	08-jun-26	Liberado. El INAH corrobora la liberación y menciona que no hay sitios de interés.	✓
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	27-ago-26	-	El socio informa que el 27 de agosto se ingresó el trámite. Se tendrá reunión con CENAGAS el 26 de octubre, con Ductos Madero el 27 de octubre y esta pendiente reunión con PEMEX; se prevé tener respuesta el 30 de noviembre 2026.	◉
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	30-oct-24	**Liberado el 30 de octubre 2024.**	✓
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	15-oct-26		Se enviará información para revisión el 28 de octubre 2026.	✎

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

⚠ Ruta crítica

Concluir los derechos de vía de la LT (~2 km), ETJ (pendiente pago) y licencia de construcción (formalizar los costos)

Línea del tiempo



SAN PEDRO SOLAR (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Huimilpan y Corregidora, Querétaro	98.2 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Elawan Wind Mexico III	01-mar-27/ 31-mar-28

Firma del contrato
09-jul-2026

250 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: En actualización	-	03-oct-26	**Central**: El socio informa que se tiene un avance de 95% y están pendiente dos propietarios, de los cuales se tienen acuerdos y falta la formalización. Se prevé concluir el 03 de octubre.
			LT: 5.46 km	En proceso	-	**LT**: CPTT de CFE apoyará con las obras de interconexión, una vez que se formalice el contrato. Depende de consulta indígena.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En evaluación	04-ago-26	-	Se ingresó desahogo del requerimiento el 1 de septiembre de 2026.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	20-ago-26	-	Se recibió respuesta de la autoridad y se presume que no se requiere ETJ por ser terrenos no forestales, siempre y cuando no haya cambio en la trayectoria de la LT.
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En evaluación	30-jul-26	-	El 28 de septiembre 2026 se ingreso el desahogo de la prevención.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	25-sep-26	09-oct-26	Se estima que la dictaminación correspondiente pueda emitirse alrededor del 09 de octubre. En caso de que se determine su procedencia, el proceso de consulta se estaría realizando aproximadamente el 26 de octubre.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: Liberado	14-ago-26	28-sep-26	Liberado el 28 de septiembre 2026. INAH solicita se le notifique una vez que inicien los trabajos para realizar visita al sitio.
			LT: En evaluación	14-ago-26	29-sep-26	El socio informa que ingresó el trámite con un trazo preliminar el 14 de agosto y el 11 de septiembre se llevó a cabo una visita. EL INAH entregará el reporte (incluye central y LT).
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	08-sep-26	Liberado.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	24-sep-26	09-oct-26	Se ingreso el 24 de septiembre 2026 solicitando opinión técnica respecto de la existencia de cauces, arroyos, escurrimientos, cuerpos de agua, así como posibles afectaciones. Le dará seguimiento CFE.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	04-ago-26	02-oct-26	Se entrego información adicional el 03 de septiembre 2026.

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**

Ruta crítica

No hay temas

Línea del tiempo



PLANTA SOLAR HAAB KIIN (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
Umán. Yucatán	123.2 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Fisterra Energy	30-nov-26/ 31-mar-29

Firma del contrato
03-jul-2026

125 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 250 ha, 20+10+10	-	17-ago-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 9 km	.	25-sep-26	**LT**: Respecto a la Línea de Transmisión (9 km), se tienen acordados los derechos de paso con ocho propietarios y están en proceso de firma.	✎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En evaluación	09-sep-26	30-oct-26	El socio informa que, el 09 de septiembre se atendió el requerimiento solicitado por la autoridad. SEMARNAT menciona que se ingresará una ampliación de plazo el 21 de septiembre y a finales de octubre se entrega la resolución.	◉
			LT: En evaluación	12-sep-26	01-nov-26	Se ingresó el 12 de agosto. SEMARNAT menciona que está en evaluación y se realizará un requerimiento de información adicional.	◉
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En evaluación	23-oct-26	-	**Central** se ingresó el 23 de octubre	◉
			LT: En elaboración			**LT** se ingresará una vez que se firmen las servidumbres de paso.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: Liberado	25-sep-26	22-oct-26	Liberado el 22 de octubre de 2026.	✓
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	-	En proceso	El socio informa que se inició el 19 de octubre 2026.	◉
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	-	En proceso	El Socio menciona que se han aceptado los presupuestos y están en espera de la formalización de los mismos.	◉
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	06-ago-26	Liberado.	✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	12-ene-26	Liberado.	✓
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	18-sep-26	Liberado.	✓

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
✎	↻	◉
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**
✓	✗	✓

⚠ Ruta crítica

Consulta indígena (en proceso) y ETJ

Línea del tiempo



SAN SIMÓN SOLAR (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
San Quintín, Baja California	80.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Fisterra Energy	15-nov-26/ 31-dic-28

Firma del contrato
03-jul-2026

250 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 400 ha, 20+10+10	-	17-ago-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 4.2 km	-	15-oct-26	**LT**: En trámite un terreno municipal, se ha hecho el pago y en espera del recibo de pago.	◔
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: Liberado	-	29-jun-26	Liberado el 29 de junio 2026.	✓
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✗
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: Liberado	-	28-nov-25	Liberado el 28 de noviembre 2025.	✓
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✗
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	20-ago-26	Liberado el 20 de agosto 2026. Antes de iniciar la construcción se debe avisar al INAH.	✓
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	28-jul-26	-	Se ingresó el trámite el 28 de julio 2026, se dará seguimiento por parte de CFE.	◔
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	06-abr-26	Liberado el 6 de abril 2026.	✓
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	18-sep-26	16-oct-26	Se ingresó información adicional el 16 de octubre 2026.	◔

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

No hay temas

Línea del tiempo



ÁLVARO OBREGÓN (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
La Paz, Baja California Sur	90.0 MW 100.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Grupo ZML	30-abr-27/ 28-oct-28

Firma del contrato
13-jul-2026

200 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 255 ha, 30 años	-	25-sep-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 400m	-	En proceso	**LT**: El socio informa que requiere conocer la longitud de la servidumbre de paso (CPTT apoyará) para iniciar los trámites correspondientes.	◉
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En evaluación	12-oct-26	-	El socio informa que ingresó la modificación de la MIA el 12 de octubre, considerando la servidumbre de 370m.	◉
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre para la central y LT.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En actualización	29-sep-26	-	El socio menciona que tiene un resolutivo (28 de mayo) considerando la ampliación de baterías. Asimismo, se informa que se ingresó el 28 de septiembre lo correspondiente a la servidumbre de paso.	◉
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✗
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	10-ago-26	En proceso	El socio ingresó el trámite el 10 de agosto. El 21 de octubre se definió el presupuesto para la prospección arqueológica. Asimismo, el socio menciona que el INAH estatal le menciona que la prospección se llevará a cabo en enero 2027.	◉
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	25-feb-26	Liberado el 25 de febrero de 2026.	✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	En proceso	-	Liberado el 30 de julio del 2024. el socio informa que tiene el resolutivo de las condicionantes emitidas en el resolutivo de la MIA. Está pendiente la evaluación de la parcela “52” de la SE de Maniobras.	◉
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	13-feb-25	Liberado el 13 de febrero de 2025.	✓

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
✎	↻	◉
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**
✓	✗	✗

⚠ Ruta crítica

ETJ de la SE de Maniobras y tramites municipales.

Línea del tiempo



DON HUMBERTO (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Culiacán, Sinaloa	19.2 MW 30.10% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Polaris	01-nov-26/ 01-abr-28

Firma del contrato
03-jul-2026

150 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 40 ha, 20+20	-	02-oct-26	**Central**: Se tienen 40 ha, mediante contrato de arrendamiento, es un predio de uso agrícola. Debidamente firmado y en proceso de registro (20 años +20). Se prevé concluir el trámite el 02 de octubre.
			LT: 1.9 km	-	25-oct-26	**LT**: Se prevé concluir los derechos inmobiliarios el 25 de octubre. El socio menciona que va a contratar a CPTT.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En evaluación	02-sep-26	-	El socio informa que se ingresó el 02 de septiembre, considerando el BESS.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: Liberado	14-sep-26	14-oct-26	El socio informa que se entregó la información complementaria el 14 de septiembre. **Liberado el 14 de octubre 2026.**
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	25-sep-26	-	El socio informa que se tiene liberado. Sin embargo, el INAH menciona que se debe renovar bajo el formato INAH-05. Se prevé ingresar el 6 de noviembre 2026 la revalidación .
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	24-sep-26	Liberado.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	6-nov-26	-	Se ingresará el 6 de noviembre 2026.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	25-sep-26	-	Se envió información vía correo el 25 de septiembre 2026 para evaluación previa; se prevé ingresar el 6 de noviembre 2026 una vez dado el visto bueno por la dependencia.

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

No hay temas críticos, sin embargo, está pendiente el ingreso de CONAGUA

Línea del tiempo



SELKA POWER PLANT I (fotovoltaico)[1]

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Romita, Guanajuato	141.4 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Selka Power	01-dic-26[1]/ 01-jun-28

Firma del contrato
03-jul-2026

150 ~ 200 Plazas



Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 233.5 ha, 25+5	18-sep-26	-	**Central**: El socio menciona que ingresaron el registro el 18 de septiembre, por lo que están en espera de la emisión de los documentos.
			LT: 11.2 km	En proceso	-	**LT**: Una vez que se formalice el contrato entre CPTT-CFE y socio se estará apoyando para la selección de sitios, trayectoria e indemnizaciones. El socio está en el entendido que iniciará la central sin tener liberada los derechos de vía de la LT.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En evaluación	21-oct-26	-	Se ingresó el 21 de octubre. El socio informa que desde 25 de mayo ingresó respuesta a la condicionante de la MIA programas ambientales y estudios técnico-económico.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio menciona que, para la central no hay cambio de uso de suelo. El socio menciona que, para la LT, se confirmará una vez que se tenga el trazo definitivo, CPTT apoyará con este tema, una vez que se formalice el contrato.
Social	SENER	EVIS	**Central**: En evaluación	21-oct-26	-	Se ingresó el 21 de octubre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que, para la LT se ingresará cuando se tengan los derechos inmobiliarios.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: Liberado	-	06-ago-26	**Liberado** el 6 de agosto 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que, para la LT está pendiente el trámite, se requiere presentar la acreditación de los derechos inmobiliarios.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central**: Liberado	-	25-ago-26	**Liberado** el 25 de agosto 2026.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: En evaluación	18-sep-26	-	Se ingresó el 18 de septiembre en la oficina de Celaya, Guanajuato
			LT: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que, una vez que tenga el trazo definitivo de la LT, ingresan el trámite.
Factibilidad	AFAC	VoBo	Central y LT: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que una vez que tenga el trazo definitivo de la LT, ingresan el trámite


En Elaboración | En Actualización | En Evaluación

Liberado | Condicionado | No Aplica

Ruta crítica

Estudios de interconexión actualizados, definición de la LT y trámites relativos a la LT.

Línea del tiempo



Nota 1.- El inversionista solicitó Prórroga de la Fecha Límite de Inicio de desarrollo

ENERGEO LOS MOLINOS (eólico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Matamoros, Tamaulipas	171.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Thermion Energy	15-dic-26/ 01-dic-28

Firma del contrato
13-jul-2026

300 ~ 400 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 3,000 ha, 30 años	-	26-ago-26	Liberado
			LT: 17 km	-	09-oct-26	Liberado
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En evaluación	08-oct-26	-	La MIA está vigente hasta 2027, la cual incluye central y LT. **Se ingresó el 08 de octubre 2026 la modificación** al proyecto por cambio en la tecnología (4.5 MW a 5.9 MW), disminución en la cantidad de aerogeneradores (70 a 30 aerogeneradores) e inclusión del BESS.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En evaluación	En proceso	-	Se hizo una visita técnica por parte de la autoridad está pendiente el pago al Fondo Forestal, se encuentra pendiente.
			LT: En evaluación	09-oct-26	-	Se ingresó el 09 de octubre 2026.
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: En elaboración	19-oct-26	-	Se ingresará actualización el 30 de octubre 2026.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	30-sep-26	-	El socio menciona que el 28 de agosto ingresó el trámite y el 30 de septiembre atendió las observaciones del INAH para la revalidación de la liberación. En evaluación, **pendiente por INAH.**
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	01-oct-26	**Liberado** el 1 de octubre 2026.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	06-oct-26	-	Se ingresó el 06 de octubre 2026.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26	-	Se ingresó el 16 de octubre 2026.

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Modificación de EVIS y Pago de Fondo Forestal (central)

Línea del tiempo



SOL DE SONORA – 70 (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Hermosillo, Sonora	70.0 MW 31.43% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Thermion Energy	01-dic-26/ 01-abr-28

Firma del contrato
13-jul-2026

~300 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 156 ha	-	26-ago-26	Liberado	✓
			LT: 2.4 km	-	26-ago-26	Liberado	✓
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	6-nov-26	-	Se ingresará modificación el 6 de noviembre 2026.	↻
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	13-nov-26	-	El socio informa que derivado del oficio de exención (2015), **se ingresará el 13 de noviembre 2026**. El socio teme que la autoridad no valide la exención y deban ingresar un nuevo trámite.	✎
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: En actualización	30-oct-26	-	El socio informa que tiene una EVIS liberada (2025), de acuerdo con lo acordado con SENER se presentará la información en alcance (por tecnología, tema de BESS y Plan de Gestión Social, de acuerdo con las disposiciones actuales), **se ingresará el 30 de octubre 2026**.	↻
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✗
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En actualización	30-oct-26	-	El 07 de octubre ingresó la revalidación de manera física y **el 30 de octubre se ingresará vía digital.**	↻
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	02-oct-26	-	Se ingresará el 2 de octubre 2026.	◎
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	6-nov-26	-	Se ingresará el 6 de noviembre 2026.	◎
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.	◎

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
✎	↻	◎
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**
✓	✗	✗

⚠ Ruta crítica

Modificación MIA y EVIS, exención del ETJ, CONAGUA y AFAC.

Línea del tiempo





AVANCES

Proyectos bajo Esquema Mixto (no prioritarios)

Datos generales, avance en gestiones de permisos y plazos de construcción estimados

Corte al 26 de octubre de 2026



2026 año de Margarita Maza

PV MOQUEL SOLAR (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
Champotón, Campeche	75.0 MW 34.08% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
ACTIS	01-ene-27/ 01-jul-28

Firma del contrato
08-jul-2026

160 Plazas



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica


Ruta crítica

Homologar la capacidad de BESS, MIA, derechos inmobiliarios de LT, ETJ de LT y consulta indígena.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 269.9 ha, 5 años +30+5+5	-	17-ago-26	Obtenidos.
			LT: 5.23 km	30-oct-26	-	**LT**: se tiene un 41% de contratos firmados (privados y ejidales), se están realizando las negociaciones en el 59% de los predios pendientes.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En actualización	30-oct-26	-	El 30 de septiembre se ingresó la modificación (layout) y actualmente se está atendiendo un requerimiento del 15 de octubre, se prevé ingresar el 30 de octubre.
			LT: En evaluación	2-oct-26	-	Se ingresó el 2 de octubre 2026.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	9-nov-26	-	Se ingresará el 9 de noviembre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Se continua con identificación y adquisición de derechos inmobiliarios.
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: Liberado	12-dic-25	14-oct-26	Liberado el 14 de octubre 2026.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	16-oct-26	-	Se inició el 16 de octubre 2026.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: Actualización	27-oct-26	-	Liberada para la central (2023). Se tiene el vuelo LiDAR y se prevé ingresar el 27 de octubre 2026.
			LT: En elaboración	27-oct-26	-	Se tiene el vuelo LiDAR y se prevé ingresar el 27 de octubre 2026.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En actualización	02-oct-26	-	Liberado el 1 de octubre 2026.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En actualización	02-oct-26	-	Liberado el 22 de octubre 2026.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En actualización	23-sep-26	-	Liberada para la central y LT (2025), sin embargo, se hizo la actualización el 14 de octubre 2026.

Línea del tiempo



GLOBAL SOLAR 3 CAMPECHE (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
El Carmen, Campeche	125.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Alten	01-ene-27/ 01-jul-28

Firma del contrato
09-jul-2026

200 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 319 ha, 40 años	-	14-ago-26	Obtenidos.	✓
			LT: 26.7 km	En proceso	-	**LT**: Depende de la firma del contrato con CPTT-CFE.	✎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En evaluación	18-sep-26	-	Se ingresó la información complementaria el 18 de septiembre.	◎
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En evaluación	18-sep-26	-	**Central**: El 18 de septiembre se ingresó el trámite en oficinas de Campeche.	◎
			LT: No aplica	-	-	**LT**: No aplica	✗
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: Liberado	17-ago-26	30-sep-26	Se cuenta con resolutivo con fecha del 30 de septiembre 2026.	✓
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	16-oct-26	-	Se conformo el consejo el 16 de octubre y se estima terminar la consulta la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre.	◎
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	-	oct	**Central**: se realizó prospección en octubre, el socio esta en espera de los resultados de la prospección.	◎
			LT: No aplica	-	-	**LT**: No aplica, a no ser que cambie la ruta de la Línea de Transmisión.	✗
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	07-ago-26	24-ago-26	Liberado el 24 de agosto 2026.	✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	15-sep-26	Liberado el 15 de septiembre 2026.	✓
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	20-oct-26	-	Se envió información adicional vía correo y esta en evaluación por la dependencia.	◎

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
✎	↻	◎
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**
✓	✗	✗

⚠ Ruta crítica

Definición de capacidad.

Línea del tiempo



FRESNILLO (PV ATOCHA) (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Fresnillo, Zacatecas	100.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Atlántica Renewable Power México	01-mar-27/ 31-dic-28

Firma del contrato
03-jul-26

400 Plazas



Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 296 ha, 20 + 20	-	07-oct-26	**Central**: Se ingresará nuevamente el registro el 07 de octubre.
			LT: 2.96 km	-	15-oct-26	**LT**: El socio informa que está en proceso la definición del trazo definitivo de la LT, se prevé concluir a mediados de octubre. CPTT apoyará.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En evaluación	23-sep-26	-	El socio informa que el 23 de septiembre 2026 se ingresó.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Se ingresará una vez que se tenga el trazo definitivo.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	16-nov-26	-	Se ingresará el 16 de noviembre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Se ingresará una vez que se tenga el trazo definitivo.
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En evaluación	30-sep-26	-	El 30 de septiembre se ingresó un solo documento para la central y la LT (con un trazo preliminar).
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	30-sep-26	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	-	30-oct-26	El socio informa que el 09 de octubre sostuvo una reunión con el INAH. Asimismo, ya fue contratado el arqueólogo responsable de realizar el salvamento arqueológico. El proyecto fue sometido a evaluación del comité el 19 de octubre y **se prevé recibir una respuesta el 30 de octubre.**
			LT: En elaboración	En proceso	-	Se ingresará una vez que se tenga el trazo definitivo.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el trámite el 30 de octubre 2026.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: Liberado	-	21-ago-26	**Liberado** el 21 de agosto 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Se ingresará una vez que se tenga el trazo definitivo.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el trámite el 30 de octubre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Se ingresará una vez que se tenga el trazo definitivo.


En Elaboración | En Actualización | En Evaluación

Liberado | Condicionado | No Aplica

Ruta crítica

Definir el trazo de la LT, trámites de la LT y ETJ de la central.

Línea del tiempo



CONCEPCIÓN MENDIZÁBAL MENDOZA FASE I (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Nava, Coahuila	339.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Atlas Renewable Energy	01-abr-27/ 01-abr-29

Firma del contrato
18-sep-2026

1,243 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central y LT**: Liberado	-	06-oct-26	El socio informa que existen áreas para el tema de reforestación, reubicación de flora, reubicación de fauna, programa de conservación y disposición de residuos vegetales.	
Ambiental	SEMARNAT	DTU	**Central y LT**: En evaluación	31-ago-26	-	**Se ingresó oficio para cambio de nombre y capacidad el 19 de octubre 2026.**	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	15-oct-26	Están incluidos en los DTU.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: Liberado	-	27-mar-26	**Liberado.** El 17 de agosto 2026 se ingresó el cambio de nombre y el 13 de octubre se ingresó la capacidad, así como se revisó la superficie declarada.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	28-oct-26	**Liberado en agosto de 2025.** El INAH informa que se debe renovar la autorización. CFE menciona que hará el trámite el 28 de octubre.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	En espera de la ingeniería, se estará ingresando la información el 30 de octubre 2026.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	28-may-26	-	Está programado realizar una visita para revisar el tema de los posibles cauces a más tardar el 28 de octubre 2026.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	En espera de la ingeniería de detalle de la línea aérea correspondiente para ingresar el trámite.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Trámites Legal Administrativo, Proceso Debida diligencia, Estudio y muestreos e Ingeniería.

Línea del tiempo



CONCEPCIÓN MENDIZÁBAL MENDOZA FASE II (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Nava, Coahuila	180.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Atlas Renewable Energy	01-abr-27/ 01-abr-29

Firma del contrato
18-sep-2026

742 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central y LT**: Liberado	-	06-oct-26	El socio informa que existen áreas para el tema de reforestación, reubicación de flora, reubicación de fauna, programa de conservación y disposición de residuos vegetales.	
Ambiental	SEMARNAT	DTU	**Central y LT**: En evaluación	31-ago-26	-	**Se ingresó oficio para cambio de nombre y capacidad el 19 de octubre 2026.**	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	15-oct-26	Están incluidos en los DTU.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: Liberado	-	20-mar-26	**Liberado.** Se presentó actualización por cambio de nombre el 17 de agosto.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	28-oct-26	**Liberado en agosto de 2025.** El INAH informa que se debe renovar la autorización. CFE menciona que hará el trámite el 28 de octubre.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	En espera de la ingeniería, se estará ingresando la información el 30 de octubre 2026.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	28-may-26	-	Está programado realizar una visita para revisar el tema de los posibles cauces a más tardar el 28 de octubre 2026.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	En espera de la ingeniería de detalle de la línea aérea correspondiente para ingresar el trámite.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Trámites Legal Administrativo, Proceso Debida diligencia, Estudio y muestreos e Ingeniería.

Línea del tiempo



CONCEPCIÓN MENDIZÁBAL MENDOZA FASE III (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Nava, Coahuila	339.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Atlas Renewable Energy	01-abr-27/ 01-abr-29

Firma del contrato
18-sep-2026

1,263 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central y LT**: Liberado	-	06-oct-26	El socio informa que existen áreas para el tema de reforestación, reubicación de flora, reubicación de fauna, programa de conservación y disposición de residuos vegetales.	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	3-jul-26	-	Se ingresó el 03 de julio de 2026. Se solicitó información adicional y se está trabajando por parte de CFE en apoyo del socio, **se prevé ingresarla a finales de noviembre.**	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En evaluación	14-ago-26	-	Se ingresó el 14 de agosto 2026, está en evaluación.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: Liberado	-	30-jul-26	**Liberado.** Resolutivo del 30 de julio 2026.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	mar-26	**Liberado en marzo 2026.**	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	En espera de la ingeniería, se estará ingresando la información el 30 de octubre 2026.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: No aplica	28-may-26	-	No aplica, sin embargo, se realizará el trámite para la opinión técnica.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	En espera de la ingeniería de detalle de la línea aérea correspondiente para ingresar el trámite.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Trámites Legal Administrativo, Proceso Debida diligencia, Estudio y muestreos e Ingeniería.

Línea del tiempo



CIMARRÓN SOLAR (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Hermosillo, Sonora	300.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
CSQB Energy	30-abr-27/ 30-abr-29

Firma del contrato
PENDIENTE

300 ~ 350 Plazas

NOTA:
La capacidad no cabe en el sistema



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 807 ha	En proceso	-	**Central**: El socio informa que para la central se tienen 807 ha, es propiedad privada y se tiene un contrato de arrendamiento. No obstante, actualmente se está haciendo una rectificación topográfica y se hará una adenda al contrato.	
			LT: Liberado	-	07-oct-26	**LT**: Liberado. La línea de transmisión se encuentra parcialmente dentro del predio y el resto sobre un derecho de vía de SICT.	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que continua en proceso la elaboración del escrito de la reconsideración de la MIA presentada (incluye central y LT).	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que ha tenido reuniones con CFE-DIPI, sin embargo, está en proceso llevar a cabo una reunión con DGIRA de SEMARNAT.	
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: En actualización	30-oct-26	-	El socio informa que tiene una EVIS (2017) para la central, sin considerar la línea de transmisión. El socio informa que continúa integrando la modificación para incluir el tema del BESS, actualizar los polígonos, la LT, y el Plan de Gestión Social. **Se prevé ingresar el 30 de octubre 2026.**	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	18-sep-26	**Liberado** el 18 de septiembre 2026.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	18-ago-26	-	Se ingresó el 18 de agosto 2026.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	oct-26	-	El socio informa que a inicios de agosto renovaron los permisos y el cronograma de trabajo, sin embargo, CONAGUA no ha respondido.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**

Ruta crítica

Regularización del Permiso de Generación, MIA, ETJ y modificación de EVIS.

Línea del tiempo



LA POZA SOLAR (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Hermosillo, Sonora	300.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
CSQB Energy	30-abr-27/ 30-abr-29

Firma del contrato
PENDIENTE

300 ~ 350 Plazas

NOTA:
La capacidad no cabe en el sistema



Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 930 ha, 20+5+5	En proceso	-	**Central**: El polígono de la central tiene 930 ha, cuenta con un contrato de subarrendamiento a 20 años + 5 + 5, se encuentra firmado y falta el registro (en proceso de subdivisión para cada proyecto). El socio informa que se está haciendo una rectificación topográfica y se hará una adenda al contrato y posteriormente su registro.
			LT: 7.4 km	En proceso	-	**LT**: se encuentra parcialmente dentro del predio y el resto sobre un derecho de vía de SICT. Se tiene el permiso de SICT (es federal) y un contrato con CAPUFE, vigentes.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En elaboración	30-nov-26	-	El socio informa que se encuentra en elaboración y se ingresará en noviembre.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	Se encuentra pendiente el recorrido para hacer la evaluación de terreno forestal, toda vez que, dicha área está declarada en el plan de desarrollo urbano. **Se tiene un oficio municipal de no aplicar ETJ.**
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En evaluación	06-oct-26	-	Se ingresó el 6 de octubre 2026.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	18-sep-26	**Liberado** el 18 de septiembre 2026.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	18-ago-26	-	Se ingresó el 18 de agosto 2026.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que están realizando el levantamiento de topografía (fotogrametría con drones), se termina estudios de campo en octubre 2026.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboevaluación	14-oct-26	-	Se ingresó el 14 de octubre 2026.


En Elaboración | En Actualización | En Evaluación

Liberado | Condicionado | No Aplica

Ruta crítica

Definición del proyecto (capacidad), MIA y ETJ.

Línea del tiempo



SUNORA (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Hermosillo, Sonora	300.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
CSQB Energy	30-abr-27/ 30-abr-29

Firma del contrato
PENDIENTE

300 ~ 350 Plazas

NOTA:
La capacidad no cabe en el sistema



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 525 ha, 20+5+5	En proceso	-	**Central**: El polígono de la central es de 525 ha, tiene un contrato de subarrendamiento a 20 años +5 + 5, se encuentra firmado y registrado. El socio informa que se está haciendo una rectificación topográfica y se hará una adenda al contrato.	
			LT: 3.65 km	En proceso	-	**LT**: se encuentra parcialmente dentro del predio y el resto sobre un derecho de vía de SICT. Se tiene el permiso de SICT (es federal) y un contrato con CAPUFE, vigentes.	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	En proceso	-	Central y LT liberada (2018). El socio informa que continua la elaboración de la modificación por el tema del BESS, si bien para la LT (3.65 km) no se requiere, se prevé ingresar una vez que concluyan los trabajos de campo.	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	Está previsto programar una reunión con DGIRA de SEMARNAT, pendiente la fecha de reunión.	
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: En actualización	30-oct-26	-	La central tiene un resolutivo (2018). El socio informa que continúa integrando la modificación para incluir el tema del BESS, actualizar los polígonos, la LT, y el Plan de Gestión Social. **Se prevé ingresar el 30 de octubre 2026.**	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	18-sep-26	**Liberado** el 18 de septiembre 2026.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	18-ago-26	-	Se ingresó el 18 de agosto 2026.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que están realizando el levantamiento de topografía (fotogrametría con drones), se termina estudios de campo en octubre 2026.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	14-oct-26	-	Se ingresó el 14 de octubre 2026.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**

Ruta crítica

Definición del proyecto (capacidad), MIA (modificación), ETJ y EVIS.

Línea del tiempo



PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES DE MÉXICO TRES (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Hecelchakán, Campeche	72.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Cúbico	30-abr-27/ 01-dic-28

Firma del contrato
03-jul-26

350 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 218 ha, 35+10+10 **LT**: 200m	-	En proceso	El socio informa que, derivado del proceso judicial que se encontraba llevando a cabo y ante la falta de acuerdos durante las audiencias que permitieran agilizar los trámites correspondientes, decidió desistirse de dichas audiencias. Asimismo, señala que actualmente cuenta con el apoyo de la Agencia de Energía de Campeche y de la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento y avance a este tema.(conflicto social)	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En evaluación	31-ago-26	-	Se ingresó el 31 de agosto 2026.	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica. Son terrenos agrícolas.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En actualización	18-sep-26	-	El socio informa que, el 18 de septiembre se ingresaron las modificaciones del BESS y el Plan de Gestión Social.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	20-nov-26	-	Se estima inicie consulta indígena el 20 de noviembre 2026.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	-	En proceso	El INAH menciona que, ya se tiene un arqueólogo asignado y espera de visto bueno del predio. Se estima iniciar con labores de prospección el 20 de noviembre 2026.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	04-sep-26	**Liberado** el 4 de septiembre 2026.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	29-feb-24	**Liberado** 29 de febrero 2024.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	21-sep-26	-	El socio comenta que envió información adicional para revisión el 21 de septiembre 2026.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Consulta Indígena y conflicto social.

Línea del tiempo



ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE (eólico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Mina, Nuevo León	300.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Cúbico	30-abr-27/ 01-jul-29

Firma del contrato
03-jul-26

650 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 6,650 ha, 50 años	-	30-ago-26	**Central**: Liberado. El socio informa que está pendiente de registro ante el RPP 6,650 ha (dato que se precisa).	
			LT: 22 km	-	05-oct-2026	**LT**: En proceso de formalización.	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En evaluación	02-oct-26	-	Se ingresó el 2 de octubre 2026.	
			LT: En elaboración	11-dic-26	-	Se ingresará el 11 de diciembre 2026.	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	15-ene-27	-	Se ingresará el 15 de enero 2027.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En evaluación	19-oct-26	-	Se ingresó el 19 de octubre 2026.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En elaboración	20-nov-26	-	Se ingresará el 20 de noviembre 2026.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	20-nov-26	-	Se ingresará el 20 de noviembre 2026.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	20-nov-26	-	Se ingresará el 20 de noviembre 2026, una vez que se termine el estudio hidrológico.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	6-nov-26	-	Se ingresará el 6 de noviembre 2026.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Definir la tecnología, definir layout y todos los trámites.

Línea del tiempo



ENERGIAS RENOVABLES SAAS (PETO) (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Peto, Yucatán	72.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Cúbico	30-abr-27/ 01-nov-28

Firma del contrato
03-jul-26

350 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 192 ha	-	17-ago-26	**Central**: Liberado. Para la central se tienen terrenos ejidales firmados y registrados por 192 ha.	✓
			LT: 1.5 km	-	En proceso	**LT**: CPTT-CFE estará apoyando. Depende de la consulta indígena.	✎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	09-oct-26	-	Se ingresó requerimiento el 09 de octubre 2026.	◔
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	11-dic-26	-	Se ingresará el 11 de diciembre 2026.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: Liberado	02-oct-26	13-oct-26	**Liberado**. Resolutivo del 13 de octubre 2026.	✓
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	23-oct-26	-	Se inicia el 23 de octubre 2026.	◔
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	-	30-oct-26	El socio informa que se esta realizando la prospección y se prevé terminar el 13 de noviembre 2026.	◔
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	03-sep-26	**Liberado** el 3 de septiembre 2026.	✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	5-abr-23	**Liberado** el 5 de abril 2023.	✓
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	21-sep-26	-	El socio comenta que envió información adicional para revisión el 21 de septiembre 2026.	◔

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Consulta Indígena, ETJ y cronograma de las obras RNTP26-PE1 que pueden afectar al COD .

Línea del tiempo



PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES KIIN (TEKAX) (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Tekax, Yucatán	56.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Cúbico	30-abr-27/ 01-nov-28

Firma del contrato
03-jul-26

350 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 113 ha, 35+10+10	-	10-ago-26	**Central**: Liberado. Dos propietarios firmados y registrados.	✓
			LT: 1.5 km	-	En proceso	**LT**: Se prevé concluir la adquisición, una vez que se tenga la Ingeniería de Detalle. Depende de la consulta indígena.	✎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	28-ago-26	-	El socio informa que, el 28 de agosto se ingresó la modificación al proyecto por el tema de BES, tecnología.	↻
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	11-dic-26	-	Se ingresará el 11 de diciembre 2026.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: Liberado	09-sep-26	7-oct-26	**Liberado**. Resolutivo del 7 de octubre 2026.	✓
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	23-oct-26	-	Se inicia el 23 de octubre 2026.	◉
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	En proceso	-	Se identificaron vestigios arqueológicos dentro de la central. El INAH envió cotización el 23 de septiembre.	◉
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	04-sep-26	**Liberado** el 4 de septiembre 2026.	✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	05-abr-23	**Liberado** el 5 de abril 2023.	✓
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	21-sep-26	-	El socio comenta que envió información adicional para revisión el 21 de septiembre 2026.	◉

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Consulta Indígena, ETJ, INAH (salvamento arqueológico) y cronograma de las obras RNTP26-PE1 que pueden afectar al COD.

Línea del tiempo



EL PALMAR (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Los Cabos, Baja California Sur	120.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Eléctrica Aselco	06-mar-27/ 30-abr-29

Firma del contrato
08-jul-2026

300 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 183 ha, 25+24	-	26-ago-26	**Central**: Liberado	✓
			LT: 1.8 km	-	26-ago-26	**LT**: Se encuentra en proceso de formalización el documento legal para los caminos con el municipio. Se tiene un 50%.	✎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En elaboración	05-nov-26	-	Se ingresará el 05 de noviembre 2026.	✎
			LT: En elaboración	23-nov-26	-	El socio informa que se ingresará la MIA de la SE de Maniobras y la LT, se prevé ingresar el 23 de noviembre 2026.	✎
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	05-nov-26	-	Se ingresará el 05 de noviembre 2026.	✎
			LT: En elaboración	23-nov-26	-	Se ingresará el 23 de noviembre 2026.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	05-nov-26	-	Se ingresará el 05 de noviembre 2026. Se está integrando la información para la central y LT.	✎
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✓
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	Pendiente	-	El INAH menciona que se hizo el recorrido y se requiere una inspección por posibles vestigios. Asimismo, se hará una liberación parcial.	◎
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.	✎
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.	✎
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.	✎

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Concluir los derechos inmobiliarios de la SE Maniobras y LT, MIA, ETJ, MISSE, PEMEX, CONAGUA Y AFAC.

Línea del tiempo

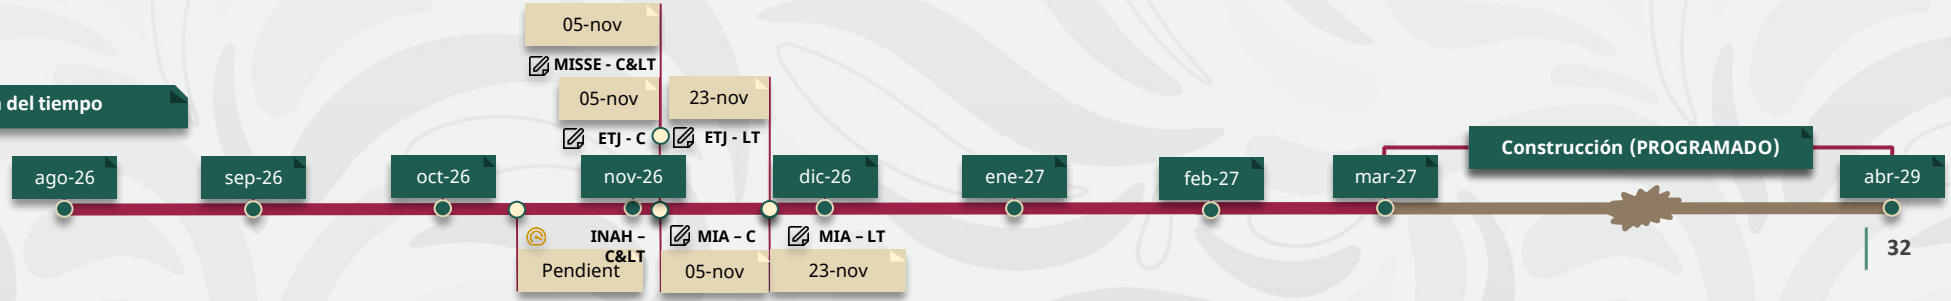

LA PASIÓN (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
La Paz, Baja California Sur	66.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Eléctrica Aselco	15-mar-27/ 31-oct-28

Firma del contrato
08-jul-2026

120 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 132 ha, 25+5	-	05-nov-26	**Central**: Liberado. Para la central se tiene contrato de arrendamiento por una superficie de 132 ha. El socio menciona que derivado de la presencia de cruces de ríos, cambiaron el polígono de la central, pero los derechos inmobiliarios se tienen, solamente se hará una adenda al contrato.	
			LT: 500 m	-	En proceso	**LT**: El socio informa que para la LT (~500 m), se tienen los derechos inmobiliarios, solamente está pendiente realizar el trámite por el cruce federal (ríos).	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En elaboración	05-nov-26	-	Se ingresará el 05 de noviembre 2026.	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	10-nov-26	-	Se ingresará el 10 de noviembre 2026.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	05-nov-26	-	Se ingresará el 05 de noviembre 2026.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se concluyeron los estudios hidrológicos y derivado de la presencia de diversos cuerpos de agua (ríos, arroyos y escurrimientos), fue necesario mover el polígono de la central. Se ingresará el 30 de octubre 2026.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Concluir los derechos inmobiliarios, MIA, ETJ, MISSE, PEMEX, CONAGUA y AFAC.

Línea del tiempo

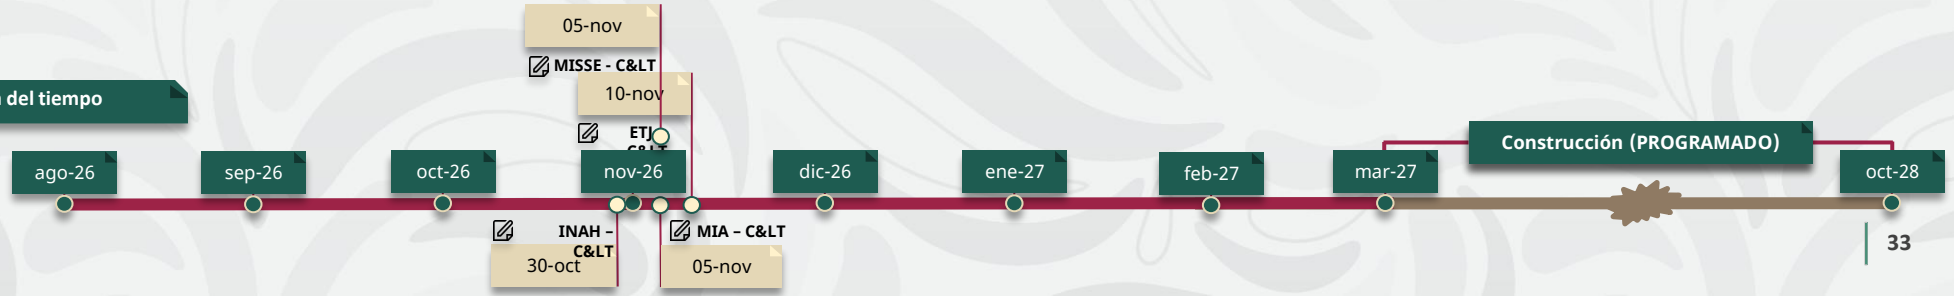

TIKINMUL (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
Campeche, Campeche	170.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Eléctrica Aselco	15-mar-27/ 30-abr-29

Firma del contrato
08-jul-2026

400 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 322 ha, 20+10	-	-	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 6 km	-	En proceso	**LT**: SENER informa que antes de obtener los derechos inmobiliarios de la LT, se debe realizar la Consulta Indígena. Se llevará a cabo una reunión el 07 de octubre para revisar el tema.	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central:** En elaboración	05-nov-26	-	El 20 de agosto la autoridad les realizó un requerimiento de información adicional, se ingresará el 5 de noviembre 2026.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	Se iniciará el trámite una vez que se tenga el trazo definitivo de la LT.	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	En proceso	-	El socio precisa que se requiere realizar el trámite para la central.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	Se iniciará el trámite una vez que se tenga el trazo definitivo de la LT.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	05-nov-26	-	Se ingresará el 5 de noviembre 2026.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En elaboración	Pendiente	-	SENER menciona que para poder iniciar este trámite es necesario ingresar la MIA y MISSE por parte del socio.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026 con un trazo preliminar de la LT.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se concluyo el estudio hidrológico; se ingresará el 30 de octubre 2026.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Formalizar la ubicación de la SE de Maniobras, MIA, ETJ, MISSE, Consulta Indígena, PEMEX, CONAGUA y AFAC.

Línea del tiempo



PLANTA SOLAR CERRO COLORADO (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Sayula de Alemán, Veracruz	455.68 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Fisterra Energy	30-nov-26/ 30-ago-29

Firma del contrato
03-jul-2026

300 Plazas



Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 1,200 ha, 20+5+5+5+5	-	17-ago-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 23 km	-	15-dic-26	**LT**: Se tiene el 75% de los derechos inmobiliarios y están en espera de la Consulta Indígena para continuar con las negociaciones con los propietarios (46).	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En evaluación	05-ago-26	15-nov-26	Se atendió requerimiento el 05 de agosto 2026.	
			LT: En evaluación	21-ago-26	-	Se ingresó el 21 de agosto, el 26 de octubre recibió requerimiento de información adicional.	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: No aplica	-	-	No aplica.	
			LT: En elaboración	-	-	Se ingresará una vez teniendo la firma de las servidumbres de paso.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En actualización	25-sep-26	-	Se solventó el requerimiento adicional el 05 de octubre.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	En proceso	-	SENER menciona que se iniciará la Consulta Indígena a principios de octubre y concluirla en noviembre.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	En proceso	-	Se informa que, 25 junio se ingresó una reconsideración del polígono uno y el 10 de septiembre se asignó un arqueólogo.	
			LT: En elaboración	15-dic-26	-	El socio informa que, para la LT, una vez que se tengan los derechos inmobiliarios se inician los trámites.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	28-jul-26	26-ago-26		✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	23-oct-26	-	Se ingresó el 26 de octubre	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En actualización	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Consulta Indígena, derechos inmobiliarios LT y ETJ LT.

Línea del tiempo



PROYECTO EÓLICO REGIÓN NORESTE (LA NORIA)

(eólico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Villa Unión, Coahuila	301.5 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Grupo Pantera	01-abr-27/ 01-abr-29

Firma del contrato
08-jul-2026

300 Plazas




Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: Liberado	-	21-sep-26	Liberado.	✓
			LT: Liberado	-	21-sep-26	Liberado.	✓
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En evaluación	30-sep-26	-	Se ingresó el 30 de septiembre 2026 para la central.	↻
			SE, entronque, caminos: En elaboración	30-oct-26	-	Se hará un segundo trámite para la SE y entronque de la apertura de LT. El socio menciona que también tramitará una MIA estatal para los caminos.	✎
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se estima ingresar el 30 de octubre 2026.	✎
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: En evaluación	13-oct-26	-	Se ingresó como EVIS (2019), sin embargo, el socio informa que integrará una actualización para incorporar los cambios asociados a la tecnología, el predio y la LT, así como cambios en el Plan de Gestión Social. Se ingresó el 13 de octubre de 2026.	↻
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✕
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	01-oct-26	-	El socio recibió un oficio donde se menciona que se requiere realizar prospección.	↻
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	15-oct-26	-	Se ingreso a mediados de octubre.	↻
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	El socio menciona que, se está realizando el estudio topográfico e hidrológico para determinar los cruces y/o escurrimientos, se prevé ingresar a finales de octubre.	✎
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	06-nov-26	-	Se va a actualizar una vez que tenga definido la tecnología (aerogeneradores) se ingresará la primera semana de noviembre.	✎

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Línea del tiempo



Ruta crítica

Obtener los estudios de interconexión con la aclaración del DEF. Permiso de Generación. MIA, ETJ, actualización de EVIS y AFAC.

SOLITARIO (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
San Luis Río Colorado, Sonora	200.0 MW 32.5% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Grupo Pantera	01-ene-27/ 29-sep-28

Firma del contrato
08-jul-2026

300 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 500 ha, 30+5	-	19-ago-26	**Central**: Liberado.
			LT: 19.7 km	-	30-oct-26	**LT**: En negociaciones.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En actualización	30-oct-26	-	Se ingresará actualización al resolutivo derivada de los ajustes relacionados con el BESS el 30 octubre 2026.
			LT: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	06-nov-26	-	Se ingresar la primer semana de noviembre.
			LT: En elaboración	06-nov-26	-	Se ingresar la primer semana de noviembre.
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En evaluación	13-oct-26	-	Se ingresó con la actualización del Plan de Gestión Social.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: Liberado	-	11-sep-26	Liberado.
			LT: En elaboración	15-nov-26	-	Una vez que se tenga el trazo definitivo, se iniciarán las gestiones, se prevé ingresar a mediados de noviembre.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	El socio informa que ingresará dos trámites: central y LT, una vez que se defina el trazo final de la LT se iniciará el trámite.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: En evaluación	17-jul-26	-	Se ingresó un escrito el 17 de julio.
			LT: En elaboración	En proceso	-	LT: una vez que se tenga el trazo definitivo se harán los trámites.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	30-sep-26	-	Se envió corre con información solicitada para revisión el 30 de septiembre de 2026.

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Homologar la capacidad del BESS: calculadora, contrato y estudios de interconexión, Iniciar trámite de Permiso de Generación, Definir el trazo final de la LT, Derechos inmobiliarios de la LT, MIA, ETJ & EVIS.

Línea del tiempo



CFV LAS GARZAS (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Lerdo, Durango	270.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
MIP Freeman Energy	31-mar-27/ 03-jul-29

Firma del contrato
PENDIENTE

300 ~ 350 Plazas

NOTA:
La capacidad no cabe en el sistema



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 700 ha, 20+20	-	30-oct-26	**Central**: Se prevé tener el contrato para octubre.	
			LT: 13.4 km	-	dic-26	**LT**: En negociaciones (30%).	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central:** En evaluación	01-sep-26	-	El 1 de septiembre el socio ingresó la información de la prevención.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	Se ingresará una vez definida la trayectoria (noviembre 2026).	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	15-nov-26	-	Será ingresada a mediados de noviembre.	
			LT: En elaboración	ene-27	-	Se contempla ingresar en enero de 2027.	
Social	SENER	MISSE	**Central**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará a finales de octubre 2026.	
			LT: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará en octubre con un trazo de preliminar.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará a finales de octubre 2026.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	07-oct-26	-	Se ingresó el 07 de octubre 2026.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: En evaluación	07-oct-26	-	Se ingresó el 07 de octubre 2026.	
			LT: En elaboración	En proceso	-		
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	15-nov-26	-	Se prevé ingresarlo a mediados de noviembre 2026.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Concluir los derechos inmobiliarios, definir el trazo de la LT, MIA de la LT, ETJ y MISSE.

Línea del tiempo



LOS GIRASOLES (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
José María Morelos, Quintana Roo	110.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Polaris	01-mar-27/ 28-nov-28

Firma del contrato
03-jul-26

200 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 231.76 ha, 20+20	-	12-ago-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 150 m	-	12-ago-26	**LT**: Liberado.	✓
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT:** En evaluación	14-may-26	-	El 5 de agosto se ingreso información adicional y se le informo al socio que **el resolutivo esta previsto salir la semana del 26 al 30 de octubre 2026.**	◎
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	23-feb-26	-	El 24 de julio 2026 se ingreso el desahogo de información adicional y se le informo al socio que el **30 de octubre 2026 se emite el resolutivo.**	◎
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	En proceso		Se requiere consulta Indígena.	◎
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En elaboración	15-nov-26	-	Se ingresará el 15 de noviembre 2026.	✎
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado		06-ago-26	Liberado.	✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará trámite el 30 de octubre 2026.	✎
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: Liberado	23-sep-26	09-oct-26	Liberado el 9 de octubre 2026.	✓

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

ETJ, MISSE, Consulta Indígena e INAH.

Línea del tiempo



SOLAR ENERGÍA TRES HERMANOS (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Huamantla, Xaloztoc y Terrenate, Tlaxcala	75.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Polaris	01-mar-27/ 01-dic-28

Firma del contrato
03-jul-26

150 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 147 ha, 20+20	-	12-ago-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 11 km	-	En proceso	**LT**: Se encuentra en proceso de formalización el contrato entre CPTT y socio.	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT:** En evaluación	23-abr-26	-	El 14 de septiembre se ingresó la información adicional y está pendiente el desistimiento de la LT. Para la MIA de la LT el socio informa que presentará la alternativa del Informe de No Requerimiento.	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central** : No aplica	-	-	No aplica.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	Está por definirse el trazo y requerimiento, en caso de ser necesario	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En evaluación	08-oct-26	-	El socio informa que tiene un requerimiento, **se ingresó el 08 de octubre 2026.**	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	Pendiente	-	La Consulta Indígena se prevé llevar a cabo a finales de octubre 2026.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	25-ago-26	-	El socio está en espera de la emisión del informe por parte del INAH y procederá a continuar con las gestiones subsecuentes.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	Una vez que se defina el trazo final de la LT, se iniciará el trámite.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado		11-ago-26	Liberado.	✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

INAH, Consulta indígena, MIA, definición del trazo de la LT, gestiones relacionadas con la definición de la LT.

Línea del tiempo



CENTRAL FOTOVOLTAICA QUASARA (fotovoltaico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Mexicali, Baja California	150.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
SuKarne – Energía Familiar	01-mar-27/ 01-ene-29

Firma del contrato
03-jul-26

300 ~ 500 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 550 ha	-	30-oct-26	**Central**: En proceso de registro con avance del 80%.	
			LT: 3.3 km	-	En proceso	**LT**: Depende de la definición del trazo.	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central:** En elaboración	28-oct-26	-	El socio informa que tiene un avance de 80%, se ingresará el 28 de octubre 2026.	
			LT: En elaboración	Pendiente	-	Se realizara con apoyo de CPTT una vez que se formalice el contrato.	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	28-oct-26	-	El socio informa que tiene un avance de 80%, se ingresará el 28 de octubre 2026.	
			LT: No aplica	-	-	No aplica	
Social	SENER	MISSE	**Central**: En elaboración	26-oct-26	-	El socio informa que tiene un avance de 80%, se ingresará el 26 de octubre 2026.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	Depende de la definición del trazo.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	06-oct-26	-	Se ingresó el 06 de octubre 2026.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	Depende de la definición del trazo.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	08-oct-26	-	Se ingresó el 8 de octubre 2026.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	14-oct-26	-	Se ingresó el 14 de octubre 2026.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	26-oct-26	-	Se ingresará el 26 de octubre 2026.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**

Ruta crítica

Concluir los derechos inmobiliarios de la SE Maniobras y LT, MIA, ETJ, MISSE y AFAC.

Línea del tiempo



EL GUAJILLO (eólico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
Reynosa, Tamaulipas	468.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Thermion Energy	20-dic-26/ 01-dic-28

Firma del contrato
13-jul-2026

800 ~ 900 Plazas



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica


Ruta crítica

Central – MIA, ETJ y MISSE. LT - definición del trazo, derechos inmobiliarios y todos los trámites.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 8,436 ha, 25+10	-	09-nov-26	**Central**: Está en proceso el registro ante el Registro Público de la Propiedad. Se prevé tenerlo en noviembre.
			LT: 44 km	-	En proceso	**LT**: pendiente de definir a todos los propietarios.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En elaboración	20-nov-26	-	Se ingresará el 20 de noviembre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Pendiente por definición del trazo.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	30-nov-26	-	Se ingresará el 30 de noviembre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Pendiente por definición del trazo.
Social	SENER	MISSE	**Central**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Pendiente por definición del trazo.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	01-oct-26	-	Se ingresó el 1 de octubre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Pendiente por definición del trazo.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central**: En evaluación	oct-26	-	Se ingresó el 6 de octubre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: En evaluación	01-oct-26	-	Se ingresó el 1 de octubre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central**: En evaluación	15-oct-26 (compromiso)	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	

Línea del tiempo



MONTECRISTO (eólico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Méndez, Tamaulipas	510.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Thermion Energy	20-dic-26/ 01-dic-28

Firma del contrato
13-jul-2026

700 ~ 800 Plazas



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica


Ruta crítica

Central – ETJ y MISSE.
LT - definición del trazo, derechos inmobiliarios y todos los trámites.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 8,700 ha, 30 años	-	nov-26	**Central**: Está en proceso el registro ante el Registro Público de la Propiedad. Se prevé tenerlo en noviembre.
			LT: 66 km	-	nov-26	**LT**: Son 19 contratos, los cuales se ingresó su registro, no obstante, están pendiente por emitirse, se prevé tener en noviembre.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En evaluación	08-oct-26	-	Se ingresó el 8 de octubre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Pendiente por definición del trazo.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	13-nov-26	-	Se ingresará el 13 de noviembre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Pendiente por definición del trazo.
Social	SENER	MISSE	**Central**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026, para la central. En proceso el desistimiento de EVIS ingresadas previamente.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Pendiente por definición del trazo.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	09-oct-26	-	Se ingresó el 9 de octubre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Pendiente por definición del trazo.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central**: En evaluación	25-sep-26	-	Se ingresó el 25 de septiembre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: En elaboración	13-nov-26	-	Se están concluyendo los estudios hidrológicos se tendrá el informe el 19 de octubre, **se ingresará el trámite el 13 de noviembre 2026.**
			LT: En elaboración	En proceso	-	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central**: En elaboración	16-oct-26	-	Se ingresó el 16 de octubre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	

Línea del tiempo



SANTA GERTRUDIS (eólico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Reynosa, Tamaulipas	503.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Thermion Energy	20-dic-26/ 01-dic-28

Firma del contrato
13-jul-2026

800 ~ 900 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 7,000 ha, 25+10	-	nov-26	**Central**: Está en proceso el registro ante el Registro Público de la Propiedad. Se prevé tenerlo en noviembre.
			LT: 44 km	-	En proceso	**LT**: Se tienen definida la ruta y falta negociar los propietarios.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En evaluación	25-sep-26	-	Se ingresó el 25 de septiembre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Pendiente por definición del trazo.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	13-nov-26	-	Se ingresará el 13 de noviembre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Pendiente por definición del trazo.
Social	SENER	MISSE	**Central**: En evaluación	07-oct-26	-	Se ingresó el 07 de octubre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Pendiente por definición del trazo.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	01-oct-26	-	Se ingresó el 01 de octubre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Pendiente por definición del trazo.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central**: En evaluación	17-sep-26	-	Se ingresó el 17 de septiembre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	Pendiente por definición del trazo.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: En evaluación	17-sep-26	-	Se ingresó el 17 de septiembre 2026.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26	-	El socio informa que el 08 de octubre les dieron el VoBo y se ingresará el 16 de octubre.

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Central – ETJ
LT - definición del trazo, derechos inmobiliarios y todos los trámites

Línea del tiempo





Proyectos que entrarán en segunda convocatoria de inversión mixta

Corte al 26 de octubre de 2026



2026 año de Margarita Maza

SIERRA MADRE [antes EL CHORRO] (eólico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Villa de Casas y Güemes, Tamaulipas	580.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Enhol & GAMEX (antes Terralia)	ene-28/ ene-30

Firma del contrato
PENDIENTE

Plazas (SIN DATO)

NOTA:
A SEGUNDA RONDA



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Formalización del contrato.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 20,000 ha	-	30-oct-26	**Central**: 30% de avance en adquisición de los derechos inmobiliarios.
			LT: ~2-5 km	-	En proceso	**LT**: Dentro de la central. Se requiere ampliación para SE Güemez.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	CFE le recomienda al socio ingresar dos trámites: uno para la central y otro para la LT.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	CFE le recomienda al socio ingresar dos trámites: uno para la central y otro para la LT.
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	CFE le recomienda al socio ingresar dos trámites: uno para la central y otro para la LT.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	Pendiente.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio menciona que el trámite será gestionado nuevamente desde el inicio.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	Se informa que para este trámite se tiene un enlace, el cual ya ha sido enviado.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	Se informa que para este trámite se requiere hacer estudios hidrológicos.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	Se informa que para este trámite se requieren las coordenadas de los naceles y la ingeniería. Asimismo, enviar la información por medio del enlace compartido.

Delaro (eólico)

Corte al:
26 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Reynosa, Tamaulipas	117.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Thermion	por definir/ por definir

Firma del contrato
PENDIENTE

Plazas (SIN DATO)

NOTA:
A SEGUNDA RONDA



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Asignación de proyecto en segunda convocatoria de Proyectos Mixtos.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 3,313 ha	-	26-ago-26	**Central**: Liberado.
			LT: 36 km	-	26-ago-26	**LT**: Liberado.
Ambiental	SEMARNAT	DTU	**Central y LT**: En elaboración	13-nov-26	-	Los DTU fueron autorizados en 2019 para la central y otro para la LT. Se realizará la modificación para la central por tecnología y tema de BESS; **se ingresará el 13 de noviembre2026.** Se ingresó ampliación de modificación de plazo al DTU el 12 de agosto 2026 para la LT. Se otorgo la ampliación el 20 agosto 2026 por 2 años de agosto del 2026 a febrero de 2028.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En actualización	30-oct-26	-	Se está trabajando en la información en alcance y **se ingresará el 30 de octubre 2026.**
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En actualización	oct-26	-	Se tiene la autorización vigente. Se ingresó hoy el formato INAH-05 para validación.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	02-oct-26	-	Se ingresó el 02 de octubre 2026.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	06-oct-26	-	Se ingresó el 06 de octubre 2026.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26	-	Se ingresará el 30 de octubre 2026.
